



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

El Proceso Unificado de Desarrollo Fase de Transición




Diseño II
Prof. Pablo Sáñez





Objetivos de la fase de Transición

Objetivo principal: gestionar la operación en el entorno del usuario (puesta en producción)



- ✓ **Puesta en Producción:** Gestionar el despliegue, la corrección de defectos encontrados en la versión beta y la migración de datos.
- ✓ **Validación:** Determinar si el sistema satisface los requisitos del negocio y de los usuarios.
- ✓ **Documentación y Capacitación:** Completar la documentación del usuario y asistir al cliente en la capacitación y en la creación de un entorno de soporte adecuado.
- ✓ **Gestión de Cambios:** Atender los cambios menores solicitados por el usuario sin afectar el plan del proyecto, reservando los cambios mayores para una futura versión.



Fase de Transición: ¿Cómo comenzar?

La forma en que se organiza la fase de Transición depende directamente del modelo de negocio del proyecto.



- ❑ *Software comercial para un mercado (uno a muchos):* Se prepara un solo producto para un **mercado** masivo (muchos clientes). Las tareas de transición se centran en la preparación de instaladores, guías de usuario y soporte.
- ❑ *Software por contrato (uno a uno):* El desarrollo es para un **cliente específico**. La transición implica una estrecha colaboración para la implementación, migración de datos y capacitación en el entorno único del cliente (puede ser interno).



Importante: La modalidad de negocio afecta la naturaleza de los **artefactos adicionales** necesarios para la transición, como paquetes de instalación, migración de datos o guías de capacitación.





Fase de Transición: ¿Cómo comenzar?

Planificación:

- Se puede planificar el trabajo conocido (ej. instalación de la versión beta), pero una cantidad considerable es **impredecible** y dependerá de los resultados de las pruebas.
- Se estima que **menos del 5%** del software tendrá que ser reelaborado.
- El trabajo restante en esta fase es significativo y requiere un gran esfuerzo.



Equipo de desarrollo:

- Debe ser similar al de la Construcción, incluyendo expertos que puedan identificar la raíz de los defectos.





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Fase de Transición: ¿Cómo comenzar?


Criterios de evaluación. Se evalúa el éxito de la fase con cinco criterios clave:



- ¿Los usuarios beta han cubierto las funciones clave?
- ¿El producto ha superado las pruebas de aceptación?
- ¿El material de usuario es de calidad aceptable?
- ¿El material de capacitación está listo?
- ¿Los usuarios y clientes están satisfechos?



Flujo de trabajo típico de Transición

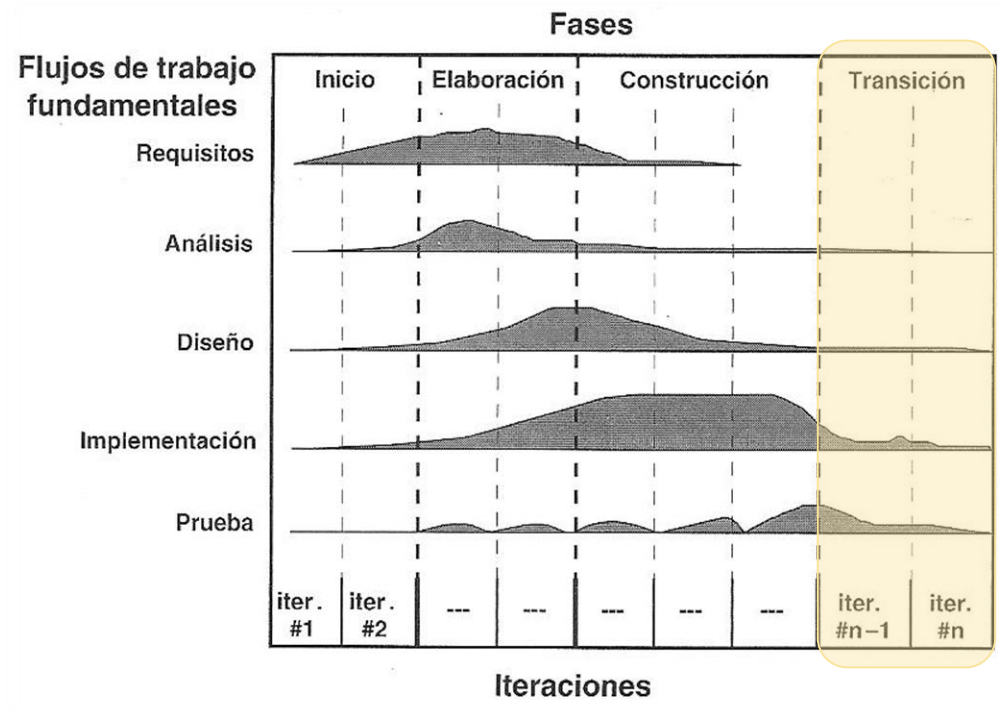

La actividad en los FTF es baja en la Transición, aunque la Implementación y las Pruebas son las que reciben mayor atención.



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Iteración típica de Transición

El detalle de actividades dependerá de factores como: producto para un mercado o cliente individual, sw. novedoso o mejora de uno existente, etc.





Finalización del análisis de costos y beneficios

El propósito principal es **juzgar la bondad y precisión** del análisis realizado en fases anteriores → Aprender!!!

- ❑ **Control del Progreso:** Se comparan las métricas clave (costos, cronograma, defectos, etc.) con lo planificado. El objetivo es registrar la información que será útil para **futuros proyectos**. La estimación se basa en el tamaño del proyecto (más preciso en esta fase) y la experiencia del equipo.
- ❑ **Revisión del Plan de Negocio:** Se determina si el proyecto fue exitoso **en términos económicos**. Esto es más sencillo en proyectos bajo contrato que en aquellos orientados a un mercado, donde el éxito económico se evalúa con métricas más complejas.





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Evaluación de la fase de Transición

Esta evaluación es la última del proyecto y su propósito principal es el **aprendizaje para proyectos futuros**.

Evaluación de iteraciones



Si las fases previas se ejecutaron correctamente, las fallas serán mínimas. En caso contrario, se debe **extender la fase** para obtener un producto satisfactorio.

Lecciones Aprendidas ("Autopsia")



Analizar lo que el equipo hizo bien y lo que hizo mal en el proyecto y en el proceso. Se documentan las lecciones aprendidas para mejorar la efectividad y el éxito de **futuros proyectos**. Fundamental registrarlo !!!



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Planificación de próximas versiones

- ✓ Como consecuencia de los avances tecnológicos, los cambios en el entorno del negocio y la evolución de las necesidades, los sistemas **no resisten sin cambios durante mucho tiempo.**
- ✓ Casi todos los productos entran en un **nuevo ciclo de desarrollo** en forma casi inmediata. Es fundamental registrar los “pendientes” u oportunidades de mejora antes de salir del proyecto.





Fase de Transición: Resumen

Objetivos de la fase:

- ☐ Garantizar la **aceptación** del usuario final.
- ☐ Despliegue exitoso del producto en su **entorno operativo**.
- ☐ Resolver los defectos finales, capacitar a los usuarios, migrar datos.

Productos:

- ☐ El sistema software ejecutable y el software de instalación.
- ☐ Documentos legales como contratos, licencias, etc.
- ☐ Todos los modelos completos y corregidos.
- ☐ La descripción completa y actualizada de la arquitectura.
- ☐ Manuales y material de capacitación, de us. final y administrador.
- ☐ Contactos y referencias para defectos o actualizaciones.



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Fase de Construcción: Hito principal

Hito principal de la fase: Lanzamiento del producto

Este hito se alcanza cuando el equipo de desarrollo y los involucrados en el proyecto llegan a un acuerdo sobre:



Se alcanzaron los objetivos planteados en la fase de Inicio.



El usuario está satisfecho.
